Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Octubre y Noviembre 2024

Estimados inversionistas

Con gusto les presentamos el reporte consolidado correspondiente a los meses de octubre y noviembre del proyecto de siembra. A lo largo de este periodo, hemos logrado avances significativos, alcanzando importantes hitos en el desarrollo del proyecto. Agradecemos su confianza y compromiso.

Estado Actual

Nos complace informar que hemos alcanzado el 100% de la siembra comprometida por parte de todos los agricultores. No obstante, durante este periodo, una de las hectáreas fue afectada permanentemente por lluvias intensas. Aunque se realizaron esfuerzos para resembrar lo más posible, anticipamos que habrá afectaciones en el rendimiento de esta área específica.

Agricultor	Hectáreas Totales	Hectáreas Sembradas	Hectáreas Pendientes	% de sembrado
Agricultor A	8	8	0	100%
Agricultor B	7	7	0	100%
Agricultor C	7	7	0	100%
Agricultor D	5.5	5.5	0	100%
Total	**27.5**	**27.5**	**0**	**100%**

Avance de la siembra 100 %

Control de Gastos Totales y vs. Presupuesto

Hasta la fecha, el gasto total del proyecto asciende a $3,129,525, lo que representa un 51% del presupuesto total asignado. El desglose de los gastos por categoría es el siguiente:

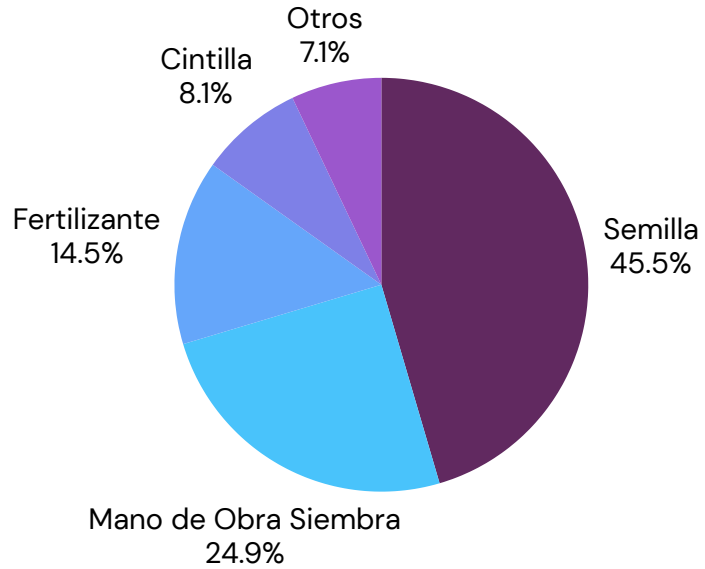

Concepto	Gasto
Semilla	$1,422,596
Mano de Obra	$779,550
Fertilizante	$453,018
Cintilla	$253,150
Otros	$221,212
Total	**$3,129,525**

Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Octubre y Noviembre 2024

A continuación se muestra el gasto presupuestado versus el gasto real por concepto. Con el paso de la siembra podremos ir obteniendo cada vez costos y presupuestos mas acertados, que nos permitan generar pronosticos de rendimiento para el final del proyecto.

Concepto	Gasto	Presupuesto	Versus presupuesto $	% Gastado del presupuesto
Semilla	$1,422,596	$2,750,000	$1,327,404	52%
Mano de Obra	$779,550	$1,815,000	$1,035,450	43%
Fertilizante	$453,018	$825,000	$371,982	55%
Cintilla	$253,150	$288,750	$35,600	88%
Otros	$221,212	$415,500	$194,288	53%
Total	**$3,129,525**	**$6,094,250**	**$2,986,784**	**51%**

Presupuesto gastado 51 %

Gasto Presupuestado por Hectárea

$221,500

Gasto Actual por Hectárea

$113,801

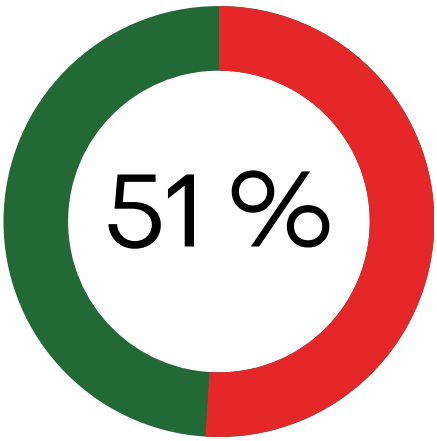

Gasto vs Presupuesto por Hectárea

El gasto por hectárea es de $113,801, manteniéndose dentro de los parámetros proyectados para esta etapa del proyecto.

Nota sobre gastos adicionales

Es importante mencionar que, como parte del acuerdo con los agricultores, existen algunos gastos relacionados con la siembra que aún no han sido reportados. Estos gastos serán entregados al cierre de la siembra, acompañados de los debidos comprobantes, como tickets de compra o depósitos bancarios.

Por esta razón, los costos reportados en este documento podrían ajustarse en el informe final del proyecto, una vez que estos gastos adicionales sean integrados. Este proceso asegura una mayor precisión en el cálculo total de costos y transparencia en la administración de los recursos.

Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Octubre y Noviembre 2024

Evidencias

A continuación, se presenta un resumen del progreso de la siembra por agricultor, destacando las hectáreas sembradas y aquellas que aún están en proceso:

Agricultor A

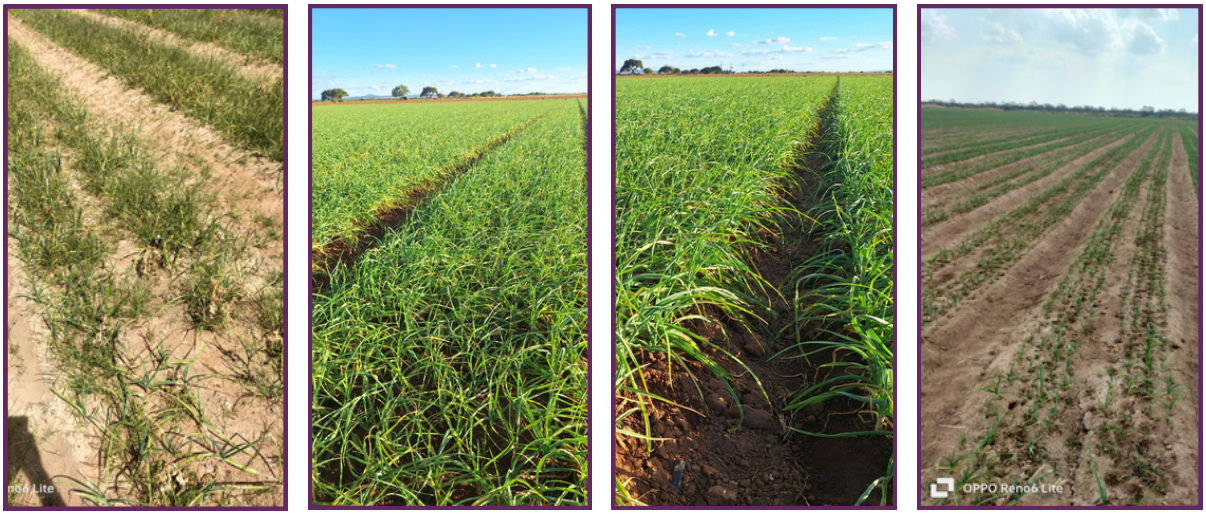

Avance de la siembra 100 %

Agricultor B

Avance de la siembra 100 %

Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Octubre y Noviembre 2024

Agricultor C

Avance de la siembra 100 %

Agricultor D

Avance de la siembra 100 %

Conclusiones

Los avances logrados en este periodo son reflejo del compromiso de los agricultores, la adecuada gestión de recursos y la planificación estratégica del equipo. Aunque enfrentamos desafíos climáticos, las medidas tomadas para mitigar los daños aseguran que el proyecto continúa avanzando conforme a lo planeado.
Quedamos a su disposición para cualquier comentario o retroalimentación.

Oscar Magaña
Director General
