Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Septiembre 2024

Bienvenidos

Hemos iniciado una nueva etapa integrando agricultores locales, tecnología y financiamiento para mejorar la producción y asegurar un suministro competitivo de ajo. Gracias por confiar en este proyecto que busca optimizar la calidad y el precio del ajo para atacar el mercado con fuerza.

Estado Actual

El proyecto de siembra avanza conforme a lo planeado. Estamos trabajando con 4 agricultores en 27.5 hectáreas, de las cuales el 85% del total de las hectáreas ya están sembradas y en mantenimiento. Solo unas pocas hectáreas están en las últimas fases de siembra y 4 hectáreas que aun no se comienzan a sembrar.

Agricultor	Hectáreas Totales	Hectáreas Sembradas	Hectáreas Pendientes	% de sembrado
Agricultor A	8	6	2	75%
Agricultor B	7	5	2	71%
Agricultor C	7	7	0	100%
Agricultor D	5.5	5.5	0	100%
Total	**27.5**	**23.5**	**4**	**85%**

Avance de la siembra 85 %

Control de Gastos Totales y vs. Presupuesto

Llevamos un control riguroso de los gastos del proyecto. Este seguimiento nos permite mantener la transparencia con nuestros inversionistas y realizar ajustes operativos donde sea necesario para maximizar la eficiencia y controlar los costos.

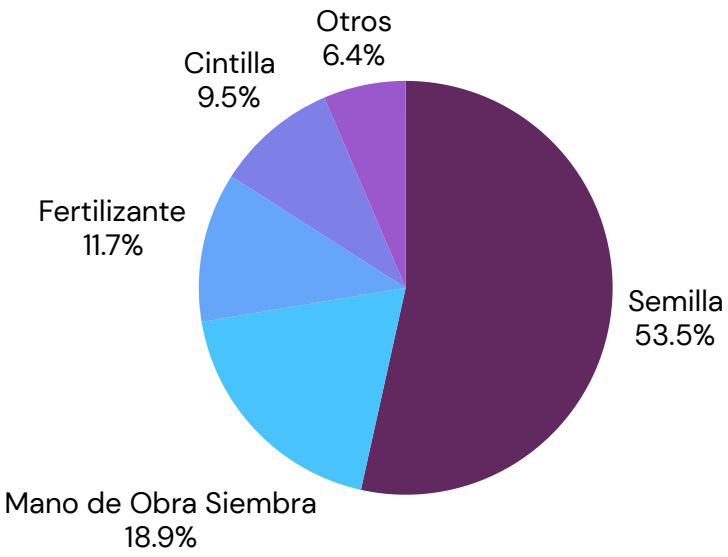

Concepto	Gasto
Semilla	$1,422,596
Mano de Obra	$502,550
Fertilizante	$310,943
Cintilla	$253,150
Otros	$171,212
Total	**$2,660,451**

Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Septiembre 2024

A continuación se muestra el gasto presupuestado versus el gasto real por concepto. Con el paso de la siembra podremos ir obteniendo cada vez costos y presupuestos mas acertados, que nos permitan generar pronosticos de rendimiento para el final del proyecto.

Concepto	Gasto	Presupuesto	Versus presupuesto $	% Gastado del presupuesto
Semilla	$1,422,596	$2,750,000	$1,327,404	52%
Mano de Obra	$502,550	$1,815,000	$1,312,450	28%
Fertilizante	$310,943	$825,000	$514,057	38%
Cintilla	$253,150	$288,750	$35,600	88%
Otros	$171,212	$412,500	$241,288	41%
Total	**$2,660,451**	**$6,091,250**	**$3,430,799**	**44%**

Presupuesto gastado 44 %

Gasto Presupuestado por Hectárea

$221,500

Gasto Actual por Hectárea

$96,744

Gasto vs Presupuesto por Hectárea

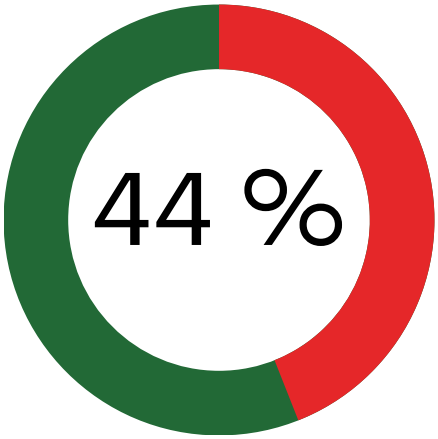

Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Septiembre 2024

Evidencias

A continuación, se presenta un resumen del progreso de la siembra por agricultor, destacando las hectáreas sembradas y aquellas que aún están en proceso:

Agricultor A

Avance de la siembra 75 %

El Agricultor A tiene un compromiso de sembrar 8 hectáreas, de las cuales se han sembrado 6. Este agricultor fue afectado por las lluvias. Las 2 hectáreas restantes estan en el proceso de resiembra.

Agricultor B

El Agricultor B tiene un compromiso de sembrar 7 hectáreas, al momento se han sembrado 5.

Avance de la siembra 71 %

Agricultor C

Avance de la siembra 100 %

El Agricultor C tiene un compromiso de sembrar 5.5 hectáreas, de las cuales se han sembrado todas.

Reporte Ejecutivo
Proyecto Siembra 2024-2025

Septiembre 2024

Agricultor D

Avance de la siembra 100 %

El Agricultor D tiene un compromiso de sembrar 7 hectáreas, de las cuales se han sembrado todas.

Panorama Actual y Riesgos

La siembra sigue su curso según lo esperado, aunque, como es común en este tipo de proyectos, las condiciones climáticas juegan un papel importante. Dos hectáreas del Agricultor A sufrió inundaciones recientes debido a lluvias excesivas, lo que podría comprometer parte de su producción. Sin embargo ya estan en proceso de siembra, lo cual genera costos adicionales no significativos. El rendimiento general del proyecto sigue en los niveles esperados.

Conclusiones

En resumen, el proyecto de siembra de ajo ha avanzado conforme a lo planificado, con la mayoría de las hectáreas sembradas y en mantenimiento. Hemos gestionado eficientemente los recursos financieros, manteniendo un control claro de los gastos y asegurando la transparencia hacia nuestros inversionistas. A pesar de algunos riesgos climáticos, el impacto ha sido mínimo y el rendimiento global sigue en los niveles proyectados.

Agradecemos el apoyo continuo de nuestros inversionistas y estamos convencidos de que este proyecto seguirá generando resultados positivos y sostenibles para todos.

Oscar Magaña

Director General
